

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2018

Onsdag 07.02.2018, KL. 1745 - 2030

Fosen Fjord Hotel, Åfjord

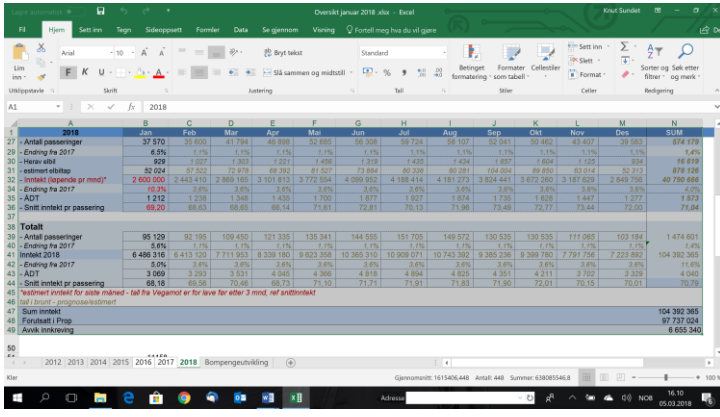
Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Karin Bjørkhaug, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem John E Høvik, varamedlem Sidsel Bryne, prosjektleder Hanne Louise Moe og daglig leder Knut Sundet.

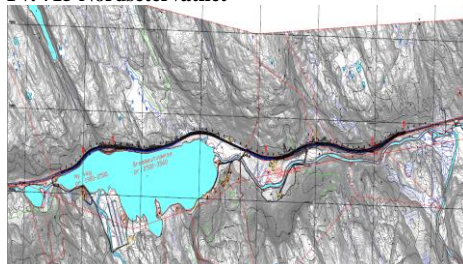
Tiltredende: byggeleder Olaf Rovik

Forøvrig tilstede:

Forfall: styremedlem Harald Fagervold, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Ogne Undertun, varamedlem Hans B Meland, varamedlem Kjell Lerstadgrind, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Tom Myrvold, varamedlem Guro Angell Gimse, tiltredende Statens vegvesen Eva Solvi.

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Behandling av saker:	Innkalling og sakliste godkjennes. Ved behandling av sak 10/2018 erklærte styremedlem Steinar Saghaug seg innhabil.	Innstillinga enstemmig godkjent
Sak 01/2018. Godkjenning av protokoll nr. 4/2017	Protokollen fra møte nr. 4/2017 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 02/2016. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 03/2018 Godkjenning av avtale om overdragelse av bompengavtalen til Vegamot AS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner fremforhandlet avtale om overføring av bompengavtalen til Vegamot AS fra Fosenvegene AS. 2. Det forutsettes at avtalen med Trøndelag fylkeskommune om utkjøp av prosjektansvarlig videreføres og at det inngås en forpliktende avtale med Vegamot AS om kjøp av oppfølgingstjeneste fra Fosenvegene AS etter 2019 og fram til utbygginga av Fosenpakken er sluttført. 3. Daglig leder gis fullmakt til å underskrive avtalene. 	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 04/2018. Status Trafikktall og bompenginntekter 2017	<p>Styret tar framlagt status av Trafikktall og Bompenginntekter for 2017 til etterretning.</p>	<p>Daglig leder gikk igjennom trafikktall og inntekter.</p> <p>Styrets vedtak: Innstillinga enstemmig vedtatt</p>

<p>Sak 05/2018 Status trafikk tall januar 2018</p>	 <p>Styret tar framlagt status av Trafikk tall og Bompenginntekter for januar 2018 til etterretning.</p>	<p>Daglig leder gikk igjennom trafikk tall og inntekter.</p> <p>Styrets vedtak: Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak06/2018 Regnskap 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar framlagt Årsberetning med Regnskap og noter for regnskapsåret 2017. 2. Styret anbefaler generalforsamlinga at Årsberetning med regnskap godkjennes som avgitt. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt.</p>
<p>Sak 07/2018 Styrets Årsmelding 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til styrets årsmelding 2017 godkjennes. 2. Styrets årsmelding legges fram for Generalforsamlinga til orientering. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt.</p>
<p>Sak 08/2018 Status fremdrift utbygging Fosenpakken</p>	<p>Prosjektleder Hanne Louise Moe og byggeleder Olaf Rovik orienterte om følgende:</p> <p>Status Fosenvegene og skredsikringsprosjekter</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ferdig bygget <ul style="list-style-type: none"> - Fv. 710 Ingdal-Valset - Fv. 755 Leksvik-Vanvikan - Rundkjøring Rissa og Sundbrua - Rørvik terminalområde - Fv. 715 Rørvik-Vanvikan - Fv. 715 Vanvikbakken - Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell I - Fv. 715 Krinsvassbrua - Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell II inkl. Olsøysvingen - Fv. 715 Melabrua - Fv. 715 Osavatnet-Rødsjøsvingen - Fv. 193 Verrabotn-Meltingen, fase I ● Under bygging <ul style="list-style-type: none"> - Fv. 715 Nordsetervatnet - Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn - Fv. 14 Sumstad-Hellfjord - Fv. 723 Paulen-Ryssdalen (skredsikring) - Fv. 715 Steinsdalen i Osen - Fv. 193 Verrabotn-Meltingen, fase II – anbudsfrist 12.3 - Planlegging av de gjenstående prosjektene pågår - Fv. 14 Berfjorden (skredsikring) - Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad - Liankrysset og Gartnesodden 	

Fv. 715 Nordsetervatnet





- **Opprinnelige kontraktsarbeider er ferdige, finpuss til våren**
- **Tilleggsbestilling på «mellomstrekket», breddeutvidelse og forsterking**
- **Sprengning, graving og steinkjøring i vinter**
- **Fresing, avretting og asfaltering til våren**
- **Samlet offisiell åpning av hele strekningen til våren (mai?)**


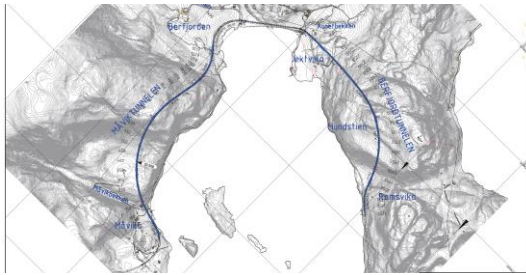
Fv. 710 Brekstad – Krinsvatnet

- Tre delparseller:
 - Ervika-Botngård
 - Storkruktjønna
 - Rissa grense
- Entreprenør Tore Løkke AS
- Kontrakten er på ca. 100 millioner kroner
- Planlagt trafikkåpning alle parseller 15.11.2018
-
- **Parsell 1 Ervika-Botngård**
- Pågår sømboring og sikring (forbolting) ved garasjen.
- Må sprengne små salver forbi her. Skal ta ned mest mulig av fjellet på innsiden, før vi legger om trafikken ned i byggegropa og tar ned terrenget på utsida.
- Videre jobbes det med VA og fylling for G/S-veg langs parsellen.
- Starter med fjellsikring rett etter påske.
- Gjenstår masseutskifting av en kvikkleiresone og fjellskjæringa mot Botngård
-
- **Parsell 2 Storkruktjønna**
- Ferdig med masseutskifting av kvikkleire under vegkroppen.
- Forbereder sprengning nær kvikkleiresonen nå, med Kattmarkaproblematikken i bakhodet.
- Små salver med strenge rystelseskrav.
- Starter med knusing, pukktutlegging og fjellsikring rett etter påske.
- Videre jobbes det med VA og sideterreng langs parsellen.
-
- **Parsell 3 Rissa grense**
- Sprengning og massetransport pågår
- Den store fyllinga vokser sakte, men sikkert
- Venter med å bygge interimsvog og legge om trafikken til våren.
- De største fjellmengdene i prosjektet er ferdig utsprengt til mai.

Fv. 715 i Osen, Steinsdalen

- Bygging og utbedring av 6 delparseller
- Til sammen ca. 7,5 km ny veg
- Dimensjoneringsklasse U-Hø1
- Vegbredde 7 meter
- Fartsgrense 70 km/t og 80 km/t
- Ca. 160 m fortau/gang-sykkelveg i sentrum
- Anslått verdi ca. 130 mill.
- **Framdrift:**
 - Alle tre reg.planer vedtatt
 - To klager ble trukket etter god dialog
 - En klage gått videre til Fylkesmannen, ikke ferdigbehandlet
 - Klagen er ikke gitt oppsettende virkning
 - Entreprisen er ute i konkurranse nå
 - Innleveringsfrist 20. desember
 - Godt oppmøte på anbudsbeifaringen
 - Anleggsstart 1. kvartal 2018
 - Trafikkåpning 4. kvartal 2019
 - Ferdigstillelse 2. kvartal 2020

	<p>Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen - status: Byggetrinn II ute i konkurranse nå:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye brukonstruksjoner og utbedring av veggeometri ved Prestvågelva og Sørvågen, til sammen ca. 1 km veg. • Ute i konkurranse nå, anbudsfrist 12. mars • Ser ut til å bli god deltakelse i konkurransen • Anleggsstart våren 2018 • Ferdigstillelsesfrist 19. oktober 2018 <p>Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden</p>   <ul style="list-style-type: none"> • I hovedsak en tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden og tilkobling til eksisterende veg i begge ender • I alt ca. 1,4 km ny veg • Hellfjordtunnelen på ca. 570 m • Tunnelklasse B, T9,5 m tunnelprofil • Større profil enn trafikkmengden tilsier (T8,5) • Kurveutretting og utvidelse av et par mindre skjæringer på Hellfjordsiden • Gjennomslag (pilot) i tunnelen planlagt fredag 9. mars Etterarbeid: vann- og frostsikring, vegbygging, elektro, portaler, teknisk bygg mv. • Planlagt trafikkåpning innen utgangen av 2018 	
<p>Sak 09/2018 Framdrift Rassikringsprosjekteer (utenfor Fosenpakken) Fv 723 Paulen – Rysdalen og Fv 6312 /fv14) Berfjorden</p>	<p>Fv. 723 Rysdalen-Herfjord</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygges etter standard Hø2 med 7,5 m vegbredde • To tunneler • Tunnelklasse B, 9,5 m tunnelprofil. • Rysdaltunnelen på 760 m • Herfjordtunnelen på 590 m • Rysdalsbrua • Brulengde 145 m. Høyde over dagens veg 43 m • Stålbjelkebru. Brudekke i betong med asfalt slitelag. • Ny veg ca. 4,6 km • Samarbeid med Statkraft • Ekstra høyde i tunnelene pga. transport av vindturbinene <ul style="list-style-type: none"> • Oppstart anleggsarbeider oktober 2017 <ul style="list-style-type: none"> – Skogrydding – Tilrigging – adkomst forskjæringer • Sprengt stor salve mellom tunnelene, 20.000 m³ • Planlagt ferdigstilt 31.10.2019 • Delfrister knyttet til Statkraft sin framdrift  	<p>Orienteringen ble enstemmig tatt til etterretning.</p> <p>Fort side 5.</p>

	<p>Fv 6312 Berfjorden</p>  <p>grafikk: Bueng AS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meget stram framdrift: <ul style="list-style-type: none"> – Vedtatt reguleringplan før sommeren – bygging i gang i løpet av 2018 – ferdigstilling høst 2020 ● Reguleringsplanarbeidet pågår, ViaNova jobber «over evne» ● Enkelte fag i egen regi i SVV ● Geoteknikk: grunnboringer påviste kvikkleire flere steder ● Raskest mulig inn på eksisterende veg etter tunnelene for å unngå kvikkleira i størst mulig grad 	<p>Styret tok enstemmig orienteringen til etterretning</p>
<p>Sak 10/2018 Fv 717 Stadsbygd – Rørvik kostnadssprekk og anmodning om omprioritering</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar daglig leders redegjørelse i sak 10/2018, vedrørende Fv 717 Stadsbygd – Vemundstad til etterretning. 2. Styret forventer at Indre Fosen kommunestyre snarlig og innen utgangen av mars 2018 foretar ny prioritering slik at prosjektene holdes innenfor gjestående ramme på kr 320 mill (2017 kr) 3. Styret vil, etter at Indre Fosen kommunestyre har vedtatt ny prioritering, behandle forslaget og gi sin anbefaling til vegeier, Trøndelag fylkeskommune, for endelig godkjenning. 	<p>Styremedlem Steinar Saghaug erklærte seg innhålig og deltok ikke i behandlingen.</p> <p>Styret vedtok enstemmig innstillinga med følgende endring i pkt 2. ... innen utgangen av april 2018.....</p>
<p>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</p>	<p>Daglig leder orienterte før behandlingen av sak 10/2018 kort om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fra Folkemøtet på Kystens Arv på Stadsbygd den 1. mars Stor deltagelse, mange innspill, liten forståelse for økonomiske rammer, kvikkleire og arkeologiske betingelser. Kostnadene ved prosjektet. Fokusområder på Stadsbygd – Vemundstad og Sund-Bradden. Stortingsproposisjonens beskrivelser og (Gamle Rissa kommunes) endringer og prioriteringer. Ingen ensartede retningsvalg på prosjektprioriteringer. Åpnet for skriftlige innspill til Indre Fosen kommune om bruk av ramma på kr 320 mill. ● Ønsket framdrift for prosjekter i Indre Fosen – ikke nye lange utredninger som tar år å avklare. 	<p>Styret tok enstemmig orienteringene til etterretning.</p>
<p>Neste møte se møteplan:</p>	<p>Møteplan 2018 On 23.05.2018 kl. 1700 On 23.05.2018 kl. 1800 (Generalforsamling) On 26.09.2018 kl. 1700 On 05.12.2018 kl. 1700</p>	
<p>Ref. Knut Sundet</p>		
